

Status, etablering af pladser til 0-2-årige

Byrådet godkendte den 8. oktober 2018 etablering af 50 0-2 års pladser i Ringsted Idrætsbørnehave, Benløse Børnegård, Børnehuset Heimdal og Snurretoppen under forudsætning for at midlerne på i alt 3,2 mio.kr. blev prioriteret i budget 2019.

Der er sendt materiale ud i indbudt licitation som hovedentreprise for alle opgaverne med budfrist tirsdag d. 12. marts 2019. Dialog med de tre bydere viste, at de er villige til at fremskynde arbejder jfr. nedenstående plan.

Projektleder og pædagogisk konsulent fra dagtilbudsområdet besøger alle institutioner mandag d. 11. marts 2019.

Ringsted Idrætsbørnehave

Behov

Der er behov for at åbne ventelisten til vuggestuepladser hurtigst muligt.

Opgave

Institutionen ombygges til en 0-6 års institution som kræver at et eksisterende grupperum om dannes til vuggestue med tilhørende puslefaciliteter. Den primære opgave er at etablere gulvvarme og nyt gulv i det store grupperum. Det kan ikke gøres mens der er børn. Det kræver en hærdning, men mens den pågår, kan de øvrige arbejder laves, og håndværkerne kan godt gå på gulvet imens. Der etableres mindre tekøkken og flyttes døre.

Udenfor skal der desuden etableres et mindre skur til parkering af barnevogne.


Plan

Gulvlægningen er pillet ud af hovedentreprisen, så den kan forceres.


Administrationen har indgået aftale med håndværker, der starter på tirsdag. Det færdighærdes midt i april, og imens foregår de øvrige arbejder.

Hvis det opstår uforudsete ting, når gulvet brydes op, sætter håndværkerne ind med ekstrainsats, så tidsplanen kan holdes.

Institutionen er klar til at **tage imod nye børn pr. 1. maj 2019**. Dette er annonceret d. 7. marts 2019.

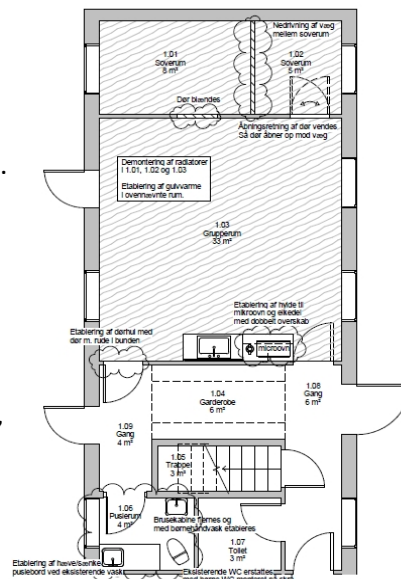

Børnehuset Heimdal

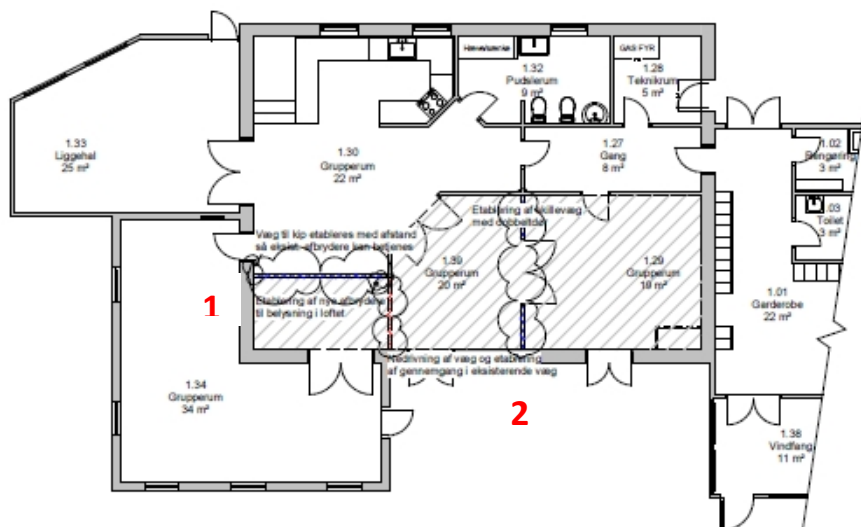

Behov

Der er et akut behov for flere vuggestuepladser lige nu i Benløse.


Opgave

Opgaven består i at opsætte en skillevæg, nedrive en del af en væg (se **1** på kortet), og etablere en væg m. dobbeltdør (se **2** på kortet). Sidstnævnte er ikke en forudsætning for den nye brug af bygningen.

Plan

Skillevæggen sættes op på et tidspunkt i april, hvor der ikke er børn på institutionen. Således er institutionen klar til at **tage imod flere børn pr. 1. maj 2019**. Da de lokaler, der skal ombygges, er fuldt ud udnyttet af vuggestuebørn nu, vil de sidste arbejder kunne foretages efter 1. maj hvor de ældste børn er gået i tidlig sfo-start, hvorfor de øvrige arbejder laves dér i samråd med institutionen. De øvrige arbejder er også puds og filtning af skillevæggen samt etablering af væg med dobbeltdør.

Snurretoppen

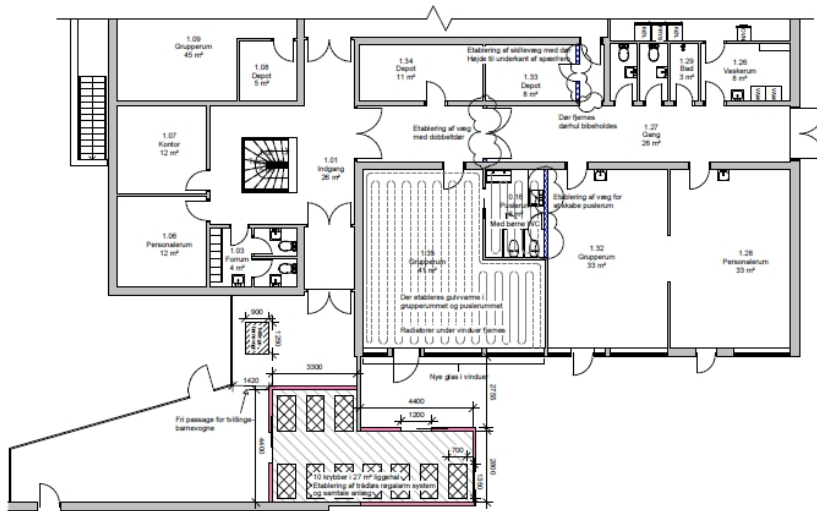

Behov

Snurretoppen kan tage imod børn nu, selv om der ikke har været en ombygning.

Opgave

Der etableres gulvvarme i grupperummet og puslerummet, der således kan huse flere børn. Der etableres liggehal i forlængelse af eksisterende skur.

Plan

Da der ikke er behov lige nu og her, kan ombygningen af Snurretoppen godt fastholdes, og kan **tage imod flere børn pr. 1. juli 2019**, som beskrevet i udbudsmaterialet.

Samlet konklusion

Arbejderne i de fire institutioner tilrettelægges med denne plan således, at det vil være muligt at kunne tage imod nye børn pr. 1. maj 2019, bortset fra i Snurretoppen, hvor der ikke er et akut behov nu og her. Denne vil først være klar pr. 1. juli 2019.

I perioden inden 1.5. er det også muligt at få plads, men muligvis på en anden institution, end den foretrukne. I et sådan tilfælde vil familien få plads på den foretrukne institution pr. 1. maj.

Tidsplan og økonomioverslag vurderes realistisk. Opstår der noget uforudset, sættes der ekstra ressourcer ind.

Projektleder følger op hos entreprenør flere gange ugentligt, og der holdes løbende møder mellem de to centre, ligesom institutionerne besøges igen.
